| Nom | Travail |
|---|---|
| **Analyse lexicosyntaxique** | **10j** |
| Lexeur & Tests | 4j |
| Parseur & Tests | 4j |
| SWOT/Charte/Planning | 2j |
| **Compilateur gérant Hello World** | **4j** |
| Tests | 2j |
| Vérification contextuelle println | 1j |
| Génération de code  (IMA minimale pour Hello World) | 1j |
| **Compilateur sans objet** | **55j** |
| **Socle contextuel (types/env/expr)** | **12j** |
| EnvironmentType | 3j |
| EnvironmentExp | 3j |
| Vérification contextuelle (vérification des noeuds) | 3j |
| Tests | 3j |
| **Contextuel complet (DeclVar/Assign/Print/Control)** | **16j** |
| DeclVar + init | 4j |
| Assign + LValue | 4j |
| Print/Println (types imprimables) | 4j |
| Tests (contextuel complet sans-objet) | 4j |
| **Generation de code (sans-objet)** | **27j** |
| IMAProgram minimal + emission HALT | 9j |
| Codegen StringLiteral/Println (WSTR/WNL) | 9j |
| Tests gencode (basic-gencode + hello-world) | 9j |
| **Compilateur pour la totalité du langage** | **42j 2h** |
| Syntaxe Objet : classes, champs, méthodes, expressions | 8j 4h |
| **Contexte Orienté Objet** | **12j 7h** |
| 1 - Classes et Héritage | 4j 2h |
| 2 - Champs et Méthodes | 4j 2h |
| 3 - Typage des expressions | 4j 2h |
| **Génération de code Objet** | **6j 5h** |
| 1 - Construction des tables des méthodes (vtable) | 1j 5h |
| 2 - new + init (Passe 2) | 1j 5h |
| 3 - Appel méthode (Passe 2) | 1j 5h |
| 4 - Tests GenCode | 1j 5h |
| Tests Orientés Objet | 14j 2h |
| Rendu version intermédiaire | |
| Rendu Final | |
| Rendu Bilan | |
| Rendu documentation | |
| Soutenance | |
| Renforcement de la base de test (Contexte, Génération de Code) | 5j 4h |
| Spécification de l'extension riscV (algorithmes) | 2j 4h |
| Gestion des rendus + Matrice des risque (risque + proba + gravité) | 2j 4h |
| Extension RiscV fonctionnelle | 8j |
| Extension RISC-V avancée | 3j 4h |
| **Rendu Final** | **42j 2h** |
| Documentation utilisateur | 8j |
| Documentation de conception | 4j 4h |
| Documentation validation | 4j 4h |
| Documentation extension | 18j 5h |
| Analyse énergétique | 4j 4h |
| Bilan Gestion d'équipe | 2j |

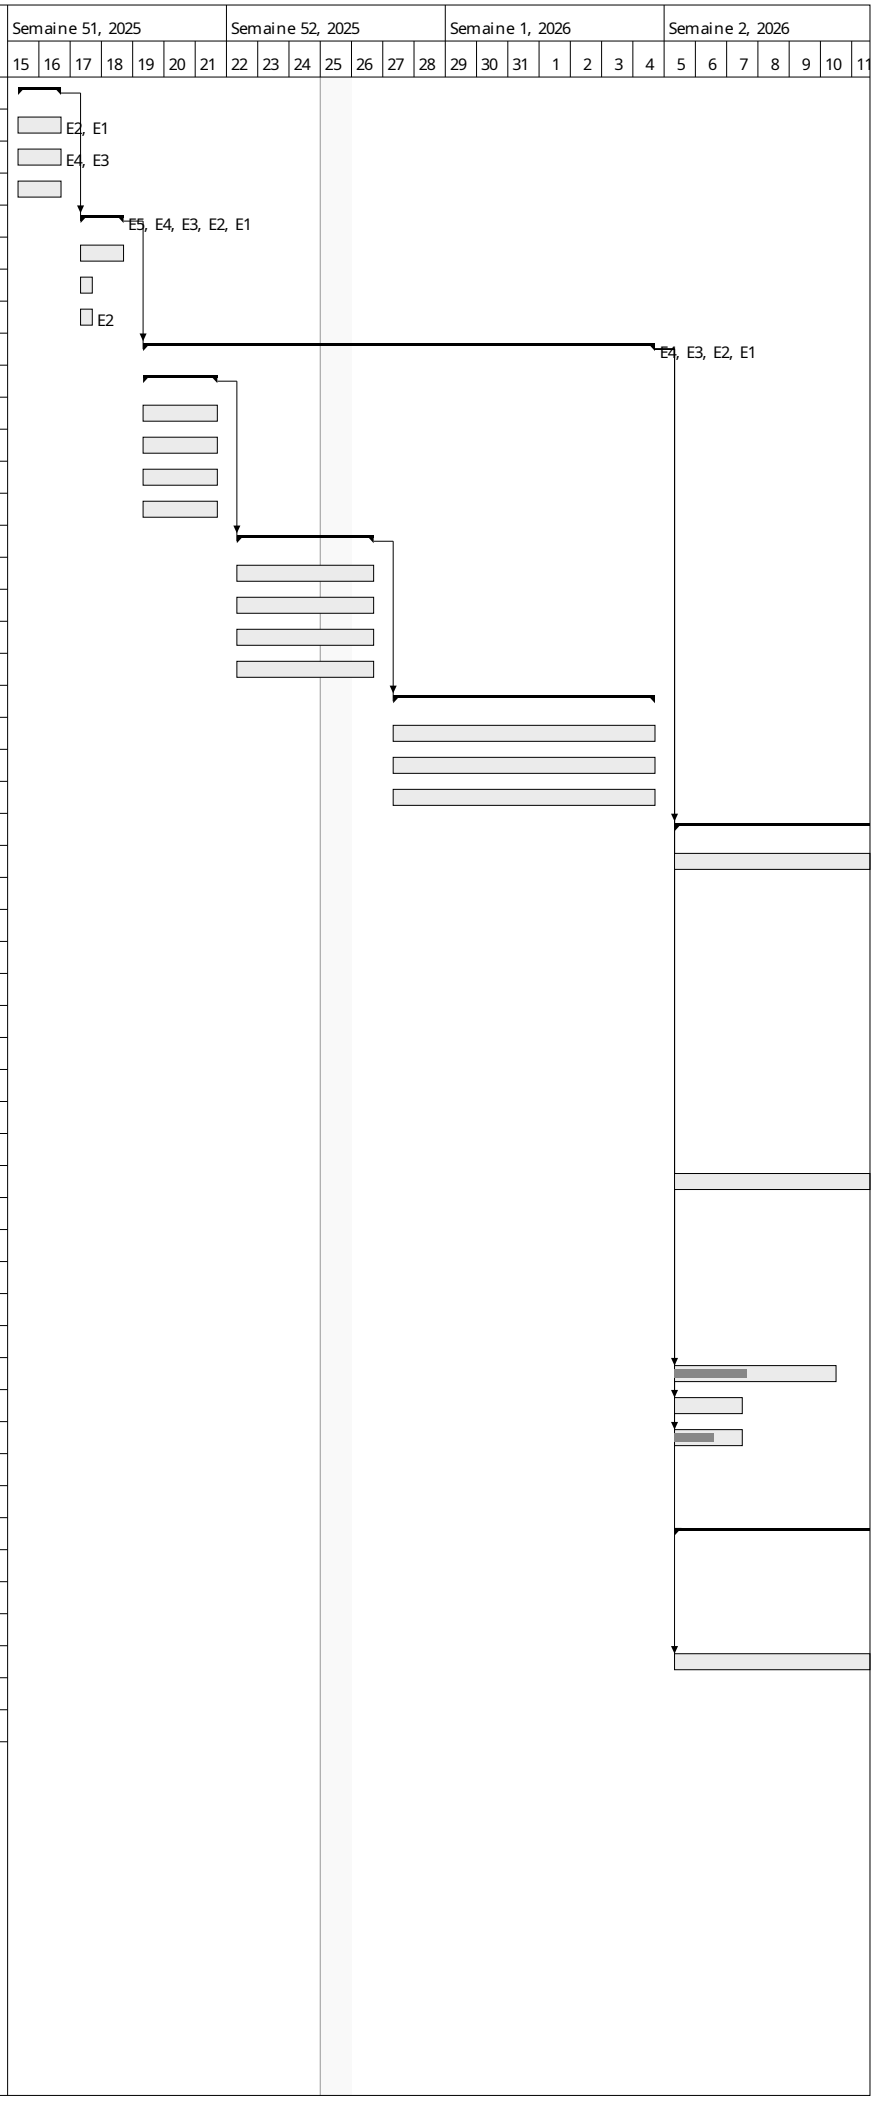

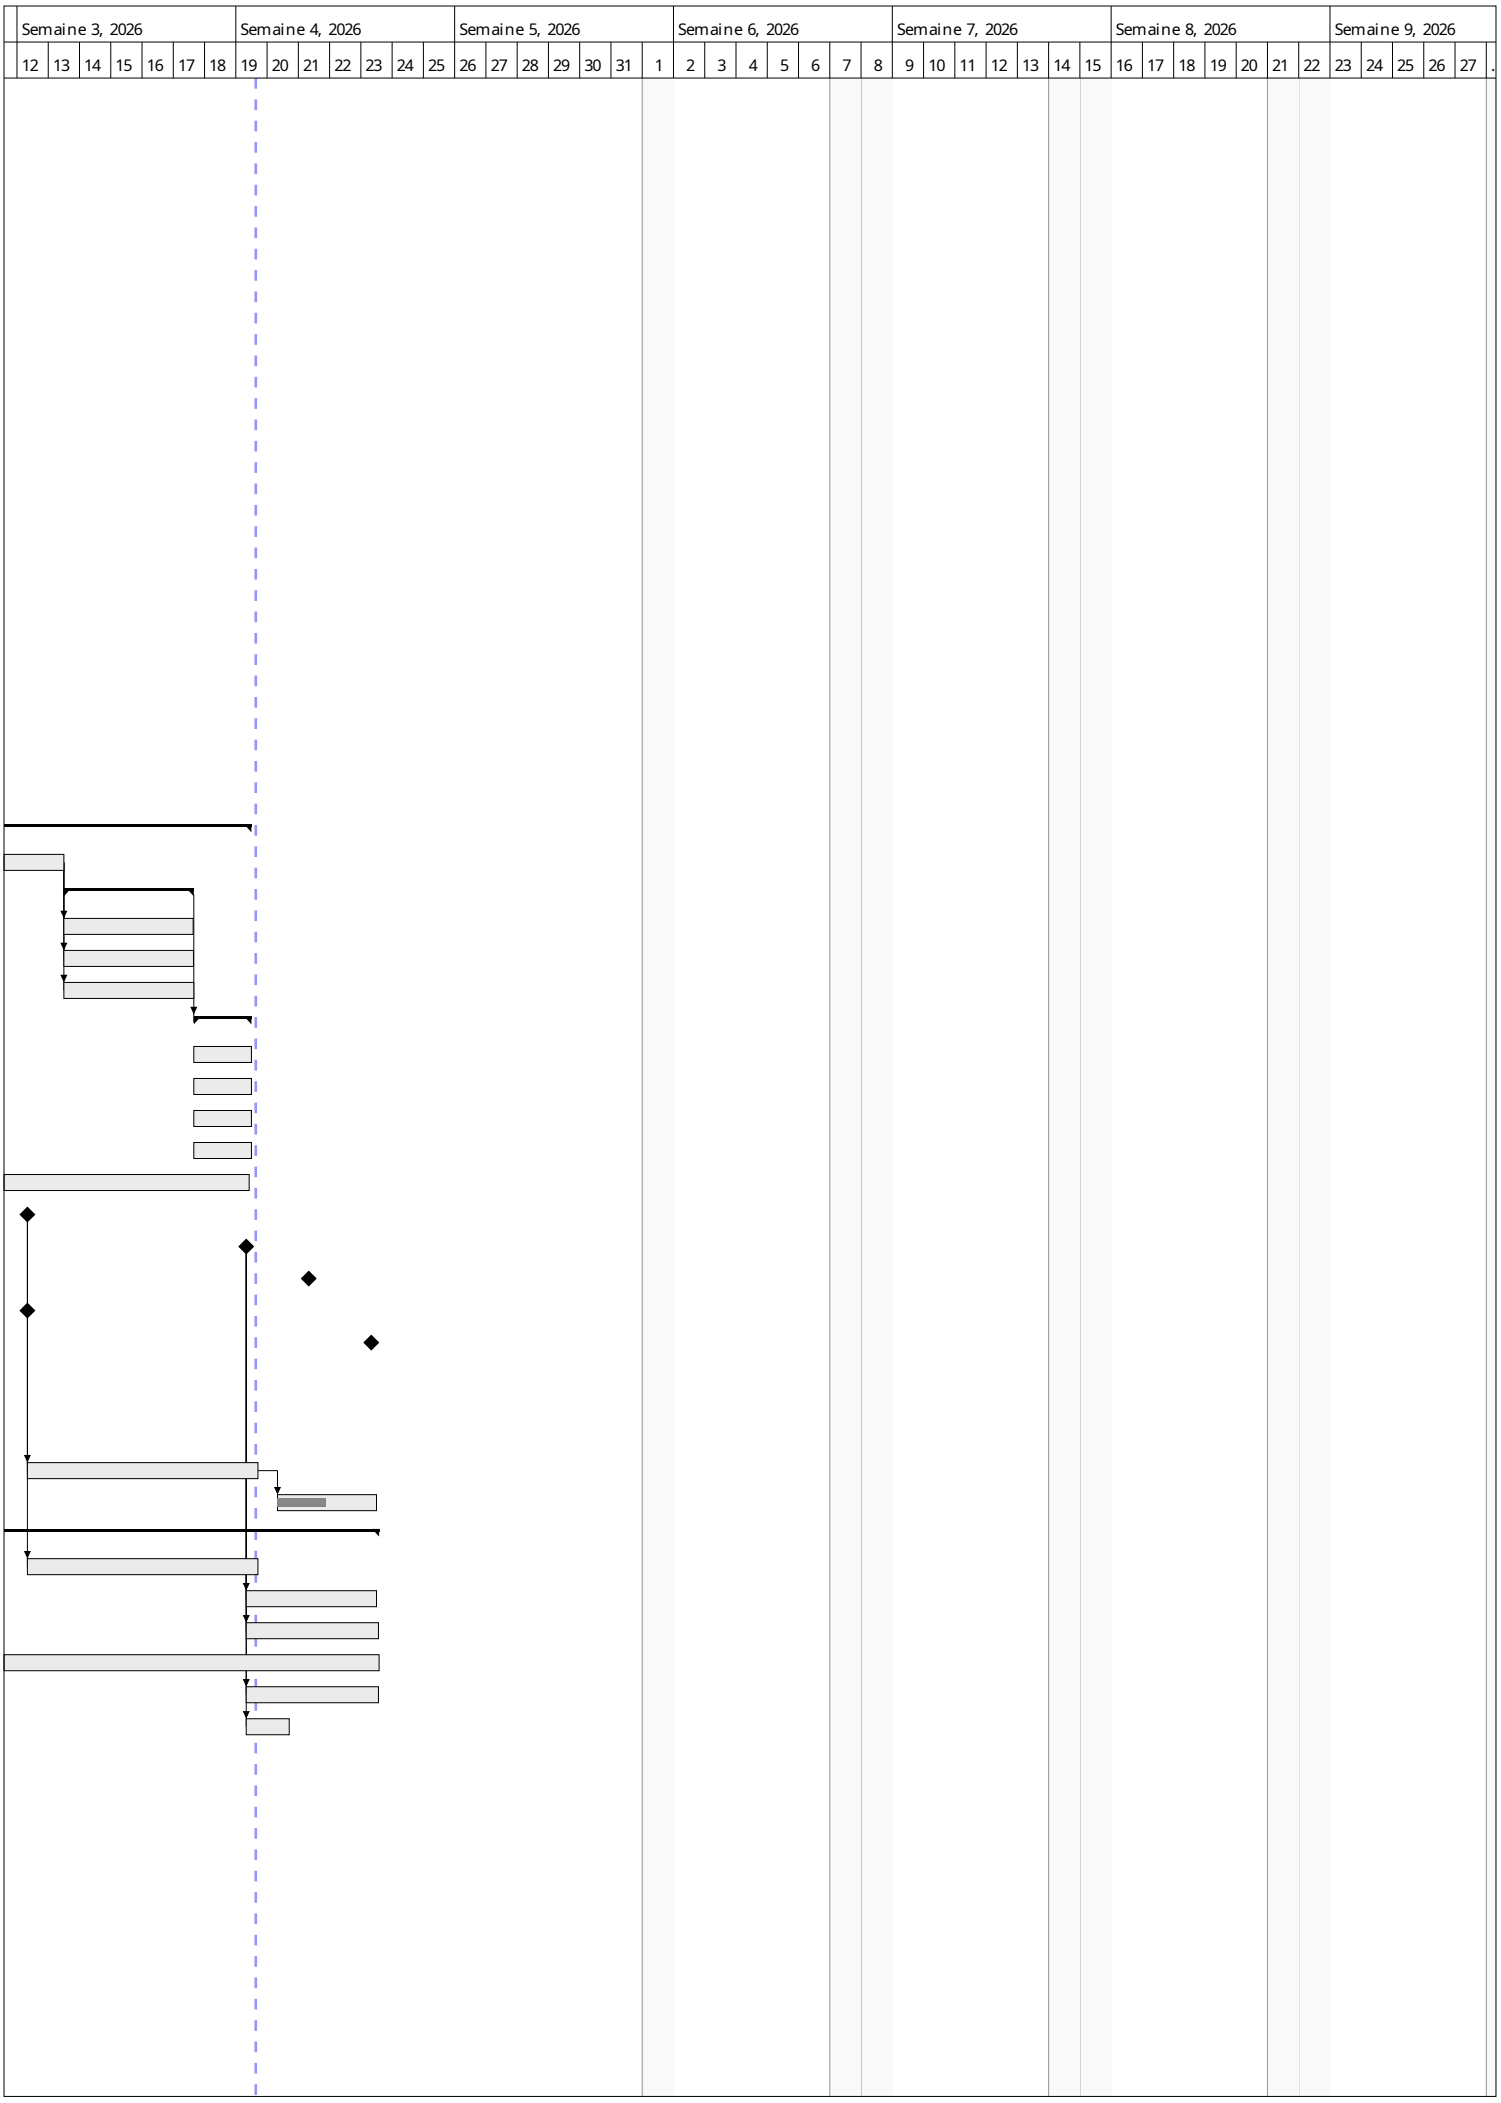
Semaine 3, 2026
Semaine 4, 2026
Semaine 5, 2026
Semaine 6, 2026
Semaine 7, 2026
Semaine 8, 2026
Semaine 9, 2026
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

| TPÉ | Nom | Démarré | Terminé | Travail | Durée | Latitude | Coût | Assigné à | État d'avancement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Analyse lexicosyntaxique** | **déc. 15** | **déc. 16** | **10j** | **2j** | | **0** | | 0 |
| 1.1 | Lexeur & Tests | déc. 15 | déc. 16 | 4j | 2j | | 0 | E1, E2 | 0 |
| 1.2 | Parseur & Tests | déc. 15 | déc. 16 | 4j | 2j | | 0 | E3, E4 | 0 |
| 1.3 | SWOT/Charte/Planning | déc. 15 | déc. 16 | 2j | 2j | | 0 | | 0 |
| 2 | **Compilateur gérant Hello World** | **déc. 17** | **déc. 18** | **4j** | **2j** | | **0** | E1, E2, E3, E4, E5 | 0 |
| 2.1 | Tests | déc. 17 | déc. 18 | 2j | 2j | | 0 | | 0 |
| 2.2 | Vérification contextuelle println | déc. 17 | déc. 17 | 1j | 1j | 1j | 0 | | 0 |
| 2.3 | Génération de code (IMA minimale pour Hello World) | déc. 17 | déc. 17 | 1j | 1j | 1j | 0 | E2 | 0 |
| 3 | **Compilateur sans objet** | **déc. 19** | **janv. 4** | **55j** | **16j** | | **0** | E1, E2, E3, E4 | 0 |
| 3.1 | **Socle contextuel (types/env/expr)** | **déc. 19** | **déc. 21** | **12j** | **3j** | | **0** | | 0 |
| 3.1.1 | EnvironmentType | déc. 19 | déc. 21 | 3j | 3j | | 0 | | 0 |
| 3.1.2 | EnvironmentExp | déc. 19 | déc. 21 | 3j | 3j | | 0 | | 0 |
| 3.1.3 | Vérification contextuelle (vérification des noeuds) | déc. 19 | déc. 21 | 3j | 3j | | 0 | | 0 |
| 3.1.4 | Tests | déc. 19 | déc. 21 | 3j | 3j | | 0 | | 0 |
| 3.2 | **Contextuel complet (DeclVar/Assign/Print/Control)** | **déc. 22** | **déc. 26** | **16j** | **4j** | | **0** | | 14 |
| 3.2.1 | DeclVar + init | déc. 22 | déc. 26 | 4j | 4j | | 0 | | 0 |
| 3.2.2 | Assign + LValue | déc. 22 | déc. 26 | 4j | 4j | | 0 | | 0 |
| 3.2.3 | Print/Println (types imprimables) | déc. 22 | déc. 26 | 4j | 4j | | 0 | | 0 |
| 3.2.4 | Tests (contextuel complet sans-objet) | déc. 22 | déc. 26 | 4j | 4j | | 0 | | 0 |
| 3.3 | **Generation de code (sans-objet)** | **déc. 27** | **janv. 4** | **27j** | **9j** | | **0** | | 0 |
| 3.3.1 | IMAProgram minimal + emission HALT | déc. 27 | janv. 4 | 9j | 9j | | 0 | | 0 |
| 3.3.2 | Codegen StringLiteral/Println (WSTR/WNL) | déc. 27 | janv. 4 | 9j | 9j | | 0 | | 0 |
| 3.3.3 | Tests gencode (basic-gencode + hello-world) | déc. 27 | janv. 4 | 9j | 9j | | 0 | | 0 |
| 4 | **Compilateur pour la totalité du langage** | **janv. 5** | **janv. 19** | **42j 2h** | **14j 4h** | **4j 1h** | **0** | | 0 |
| 4.1 | Syntaxe Objet : classes, champs, méthodes, expressions | janv. 5 | janv. 13 | 8j 4h | 8j 4h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.2 | **Contexte Orienté Objet** | **janv. 13** | **janv. 17** | **12j 7h** | **4j 2h** | **4j 1h** | **0** | | 0 |
| 4.2.1 | 1 - Classes et Héritage | janv. 13 | janv. 17 | 4j 2h | 4j 2h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.2.2 | 2 - Champs et Méthodes | janv. 13 | janv. 17 | 4j 2h | 4j 2h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.2.3 | 3 - Typage des expressions | janv. 13 | janv. 17 | 4j 2h | 4j 2h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.3 | **Génération de code Objet** | **janv. 17** | **janv. 19** | **6j 5h** | **1j 5h** | **4j 1h** | **0** | | 0 |
| 4.3.1 | 1 - Construction des tables des méthodes (vtable) | janv. 17 | janv. 19 | 1j 5h | 1j 5h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.3.2 | 2 - new + init (Passe 2) | janv. 17 | janv. 19 | 1j 5h | 1j 5h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.3.3 | 3 - Appel méthode (Passe 2) | janv. 17 | janv. 19 | 1j 5h | 1j 5h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.3.4 | 4 - Tests GenCode | janv. 17 | janv. 19 | 1j 5h | 1j 5h | 4j 1h | 0 | | 0 |
| 4.4 | Tests Orientés Objet | janv. 5 | janv. 19 | 14j 2h | 14j 2h | 4j 2h | 0 | | 0 |
| 5 | Rendu version intermédiaire | janv. 12 | janv. 12 | N/D | N/D | | 0 | | 0 |
| 6 | Rendu Final | janv. 19 | janv. 19 | N/D | N/D | | 0 | | 0 |
| 7 | Rendu Bilan | janv. 21 | janv. 21 | N/D | N/D | 2j 5h | 0 | | 0 |
| 8 | Rendu documentation | janv. 12 | janv. 12 | N/D | N/D | 11j 5h | 0 | | 0 |
| 9 | Soutenance | janv. 23 | janv. 23 | N/D | N/D | 5h | 0 | | 0 |
| 10 | Renforcement de la base de test (Contexte, Génération de Code) | janv. 5 | janv. 10 | 5j 4h | 5j 4h | 13j 1h | 0 | | 45 |
| 11 | Spécification de l'extension riscV (algorithmes) | janv. 5 | janv. 7 | 2j 4h | 2j 4h | 16j 1h | 0 | | 0 |
| 12 | Gestion des rendus + Matrice des risque (risque + proba + gravité) | janv. 5 | janv. 7 | 2j 4h | 2j 4h | 16j 1h | 0 | | 58 |
| 13 | Extension RiscV fonctionnelle | janv. 12 | janv. 19 | 8j | 8j | | 0 | | 0 |
| 14 | Extension RISC-V avancée | janv. 20 | janv. 23 | 3j 4h | 3j 4h | 1h | 0 | | 49 |
| 15 | **Rendu Final** | **janv. 5** | **janv. 23** | **42j 2h** | **18j 5h** | | **0** | | 0 |
| 15.1 | Documentation utilisateur | janv. 12 | janv. 19 | 8j | 8j | 3j 5h | 0 | | 0 |
| 15.2 | Documentation de conception | janv. 19 | janv. 23 | 4j 4h | 4j 4h | 1h | 0 | | 0 |
| 15.3 | Documentation validation | janv. 19 | janv. 23 | 4j 4h | 4j 4h | 30min | 0 | | 0 |
| 15.4 | Documentation extension | janv. 5 | janv. 23 | 18j 5h | 18j 5h | | 0 | | 0 |
| 15.5 | Analyse énergétique | janv. 19 | janv. 23 | 4j 4h | 4j 4h | 30min | 0 | | 0 |
| 15.6 | Bilan Gestion d'équipe | janv. 19 | janv. 20 | 2j | 2j | 2j 5h | 0 | | 0 |

| Nom | Nom abrégé | Type | Groupe | Adresse électronique | Coût |
|---|---|---|---|---|---|
| Etudiant 5 | E5 | Travail | | | 0 |
| Etudiant 4 | E4 | Travail | | | 0 |
| Etudiant 3 | E3 | Travail | | | 0 |
| Etudiant 2 | E2 | Travail | | | 0 |
| Etudiant 1 | E1 | Travail | | | 0 |
